



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Энергетического управления
(главный энергетик) АО "Алтай-Кокс"

Е.Г. Голущенко

29 июля 2022 г.

ПРОТОКОЛ

29 июля 2022 г.

№ 11

г. Заринск

Технического совещания по вопросу гидравлического и теплового режима работы тепловой сети от ТП-71

В работе принимали участие: начальник ООЭЭ АО «Алтай-Кокс» Д.В. Медуница, технический директор ООО "ЖКУ" К.Н. Качин.

Рассмотрен вопрос гидравлического и теплового режима работы тепловой сети от ТП-71 на отопительный сезон 2022 - 2023 гг.

Приняты решения:

Принять предложения по гидравлическому и тепловому режиму работы тепловой сети от ТП-71 на отопительный сезон 2022 - 2023гг., а именно:

1. Режим отпуска тепла с ТП-71 на коттеджи – качественный по графику 90 – 70 °С (срезка температуры подачи – на 85°С при низких температурах наружного воздуха).
2. Отопительный период работы теплосети по приборам теплосчетчика на 2-й контур:
 - давление в прямой магистрали – $5,5 \pm 0,5$ кгс/см²;
 - давление в обратной магистрали на ТП-71 – $2,5 \pm 0,5$ кгс/см².

Приложение: Температурный график на 2022-2023гг.

Начальник ООЭЭ АО «Алтай-Кокс»

Д.В. Медуница

СОГЛАСОВАНО

Технический директор ООО "ЖКУ"

К.Н. Качин




УТВЕРЖДАЮ

Начальник Энергетического управления
(главный энергетик) АО "Алтай-Кокс"

Е.Г. Голущенко

29 июля 2022.

Температурный график ТП-71
(отопительного сезона 2022-2023 г.г.)

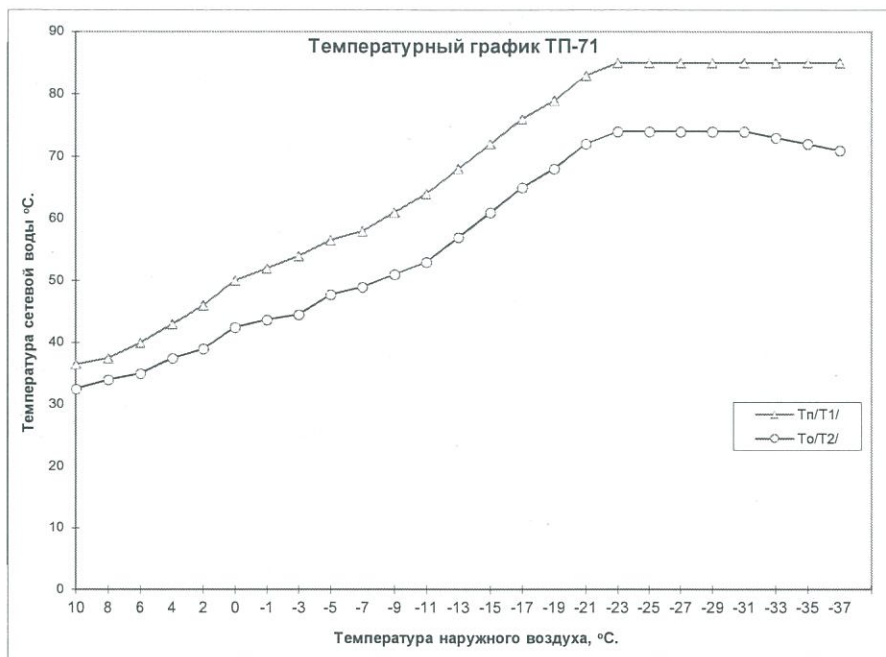

Добавки на ветер (°C)
при V>5м/сек

Тн.в.	Тп/Т1/	То/Т2/	Тп/10/	Тп/15/
10	36,5	32,5	V<10м/с	V<15м/с
8	37,5	34	-	-
6	40	35	-	-
4	43	37,5	-	-
2	46	39	3	5
0	50	42,5	3	6
-1	52	43,7	3	6
-3	54	44,5	3	6
-5	56,5	47,8	3	6
-7	58	49	4	7
-9	61	51	4	7
-11	64	53	4	8
-13	68	57	4	8
-15	72	61	4	8
-17	76	65	5	9
-19	79	68	5	6
-21	83	72	2	2
-23	85	74	-	-
-25	85	74	-	-
-27	85	74	-	-
-29	85	74	-	-
-31	85	74	-	-
-33	85	73	-	-
-35	85	72	-	-
-37	85	71	-	-

Условные обозначения:

- Тн.в. - Температура наружного воздуха, °C;
Тп/Т1/- Температура прямой сетевой воды на коттеджи, °C;
То/Т2/- Температура обратной сетевой воды с коттеджей, °C (Расчётная);
Тп/10/- Поправка температуры прямой сетевой воды на ветер, при V ветра = 5 -10 м/сек;
Тп/15/- Поправка температуры прямой сетевой воды на ветер, при V ветра = 10 -15 м/сек.

Начальник ООЭЭ АО "Алтай-Кокс"

Д.В. Медуница

СОГЛАСОВАНО

Технический директор ООО "ЖКУ"

К.Н. Качин
